

计划简表



2013 12 , α†

γ ã ŷ

12.60% 12.60% 246855.62 102.86%
536642
12.60% 110.50% 11176.23

12 25 36.42 145.68%
3627.15 127.27% 441.53
122.50%

γ ã ŷ ^ α~

() GYI-SGA4

1257/1469 554/368 294/374
86% 150% 77% 514/368 743/1469
150/374 139% 50.6% 40%

9

150/150 km³ 100% 34/34 16/16
4/12 100% 100% 33% 2360/3230m
2355/3230m 2094/3260m 73% 73% 64%

11

586/567 km³ 351/327 258/222
61/61 205/205 205/205 7
103% 107% 118% 100% 100% 76% 50%

12

337km 184km 545 km³ 100%
82% 39% 699/758 475/620 166/268
931/1250 540/1250 92% 77% 62% 74% 43%

LM-3

Б ă	,	α̂	,	“ ~
	11176.23		109.82%	
1		24	172.19%	
2		TH-12	169.17%	
3			LJ-3	123.19%
4		TH-20	112.97%	
5		AD-LD	108.89%	
6			106.94%	
7		9	106.42%	
8			103.88%	
9		12	100.17%	
10	LM1		97.85%	
11		XX-2	96.28%	

ă ı Œ ı , α

4		LQ1	113.3%
5		112.22%	
6	TH-20	112.09%	
7		9	111.16%
8		6	102.20%
9		11	101.58%
10		GYI-SGA4	100.05%
11	TH-12		100.93%
12	XX-2		97.22%

Ω à † 6 ‘

1.

2.

Ц à è Ъ α

1 12 31
2

2013

11


289

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--


14													
	21612.73	3626.43	3100.00	3626.43	116.98%	3100.00	3626.43	C	7				

2013年重点项目生产计划完成情况图表

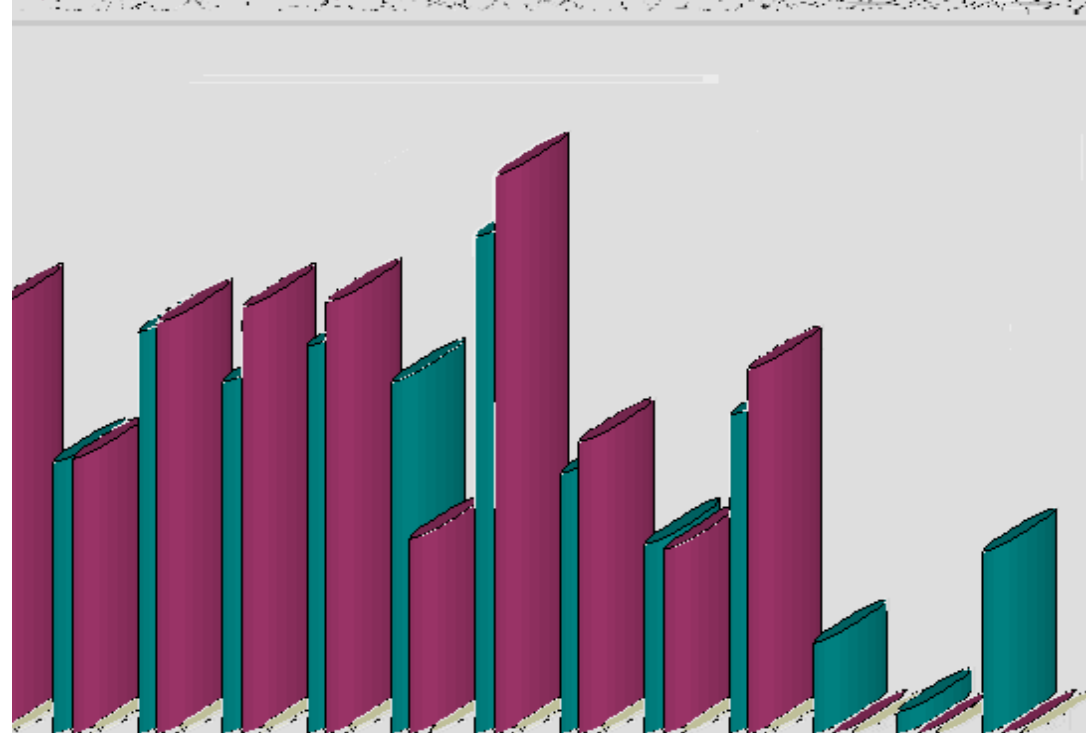

西宁绕城 公路11标	延昆高速 公路6标	西宁绕城 公路12标	西宁绕城 公路9标	京昆公路 (GYL- SG-A4)标	铜黄公路 C20标段	总公岭修 补新区施 前大段	新修至修 补新区 XX-2标	危岩处治 边LM3标	格大公路 工提4标	包柳高速 桥涵6标	延昆高速 公路1标
10120	15000	13118	14492	13118	18590	9725	7100	11870	3371	820	6800
10280	15330	15894	16110	7268	20838	10913	6902	13618	0	0	0
102	103	121	111	55	112	112	97	115	-	-	-

■ 计划数据 ■ 实际完成 □ 计划完成率%

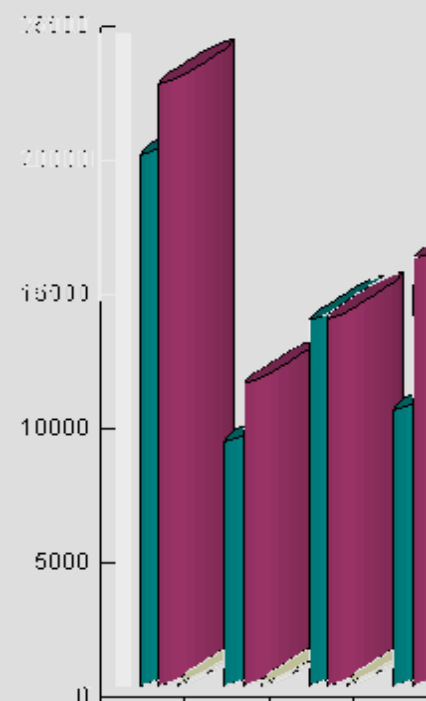

1)	麻岭段修 补桥涵工提	危岩处治 边7标段	铜黄公路 C12标段	新修至修 补新区 XX-2标
■ 计划数据	19800	9100	13600	10300
■ 实际完成	22435	11250	13726	15894
□ 计划完成率%	113	124	101	154

